


令和元年度実施 社会資本総合整備計画 事後評価・中間評価



袖ヶ浦市

社会資本総合整備計画とは

社会資本整備総合交付金の概要

概要

◇社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって…

自由度が高く、創意工夫を活かせる総合的な交付金として平成22年度に創設。

特徴（従前の補助金との違い）

◇これまで事業別にバラバラで行ってきた関係事務を一本化・統一化


◇計画に位置付けられた事業の範囲内で、地方公共団体が国費を自由に充当可能

◇基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高める事業についても、創意工夫を生かして実施可能

<従前の補助金>



個別補助金を原則禁止



社会資本整備総合交付金

【社会資本整備総合交付金】

- ・成長力強化や地域活性化等につながる事業

【防災・安全交付金】

- ・「命と暮らしを守るインフラ再構築」、
「生活空間の安全確保」を集中的に支援

住宅・社会資本の整備



効果促進事業

整備計画に掲げる政策目標の達成（成果指標で**評価を実施**）

袖ヶ浦市の下水道事業における社会資本総合整備計画の概要について

社会資本整備総合交付金

交付金の種類

社会資本整備総合交付金

計画名

袖ヶ浦市における生活環境の改善
(Ⅱ期)

交付金の種類

防災・安全交付金

計画名

袖ヶ浦市における防災・安全対策
強化に貢献する下水道整備 (Ⅱ期)
(防災・安全)

基幹事業 (交付対象事業)

未普及解消

- ・奈良輪第一汚水幹線整備
- ・久保田第一汚水幹線整備

終末処理場長寿命化

- ・袖ヶ浦終末処理場改築
- ・袖ヶ浦終末処理場長寿命化計画

総合地震対策

- ・南部汚水幹線整備
- ・北部汚水幹線整備
- ・横田第一汚水幹線整備
- ・袖ヶ浦市総合地震対策計画 (Ⅲ期)

ストックマネジメント

- ・袖ヶ浦市ストックマネジメント計画

浸水対策

- ・奈良輪第一雨水幹線整備
- ・代宿第二雨水幹線整備

事後評価

- 社会資本整備総合交付金 -

計画概要

社会資本総合整備計画 事後評価調書

◆計画の名称

袖ヶ浦市における生活環境の改善（Ⅱ期）

◆計画期間

平成28年度～平成30年度【3年間】

◆計画の目標

污水排水施設を整備することにより、水環境や生活環境の改善・公共用水域の水質保全を図る。

◆主な事業

袖ヶ浦駅海側地区污水管整備、椎の森地区污水管整備

計画概要

— 未普及解消とは① —


整備当初 (H25)



計画概要

— 未普及解消とは① —


整備後 (H29)

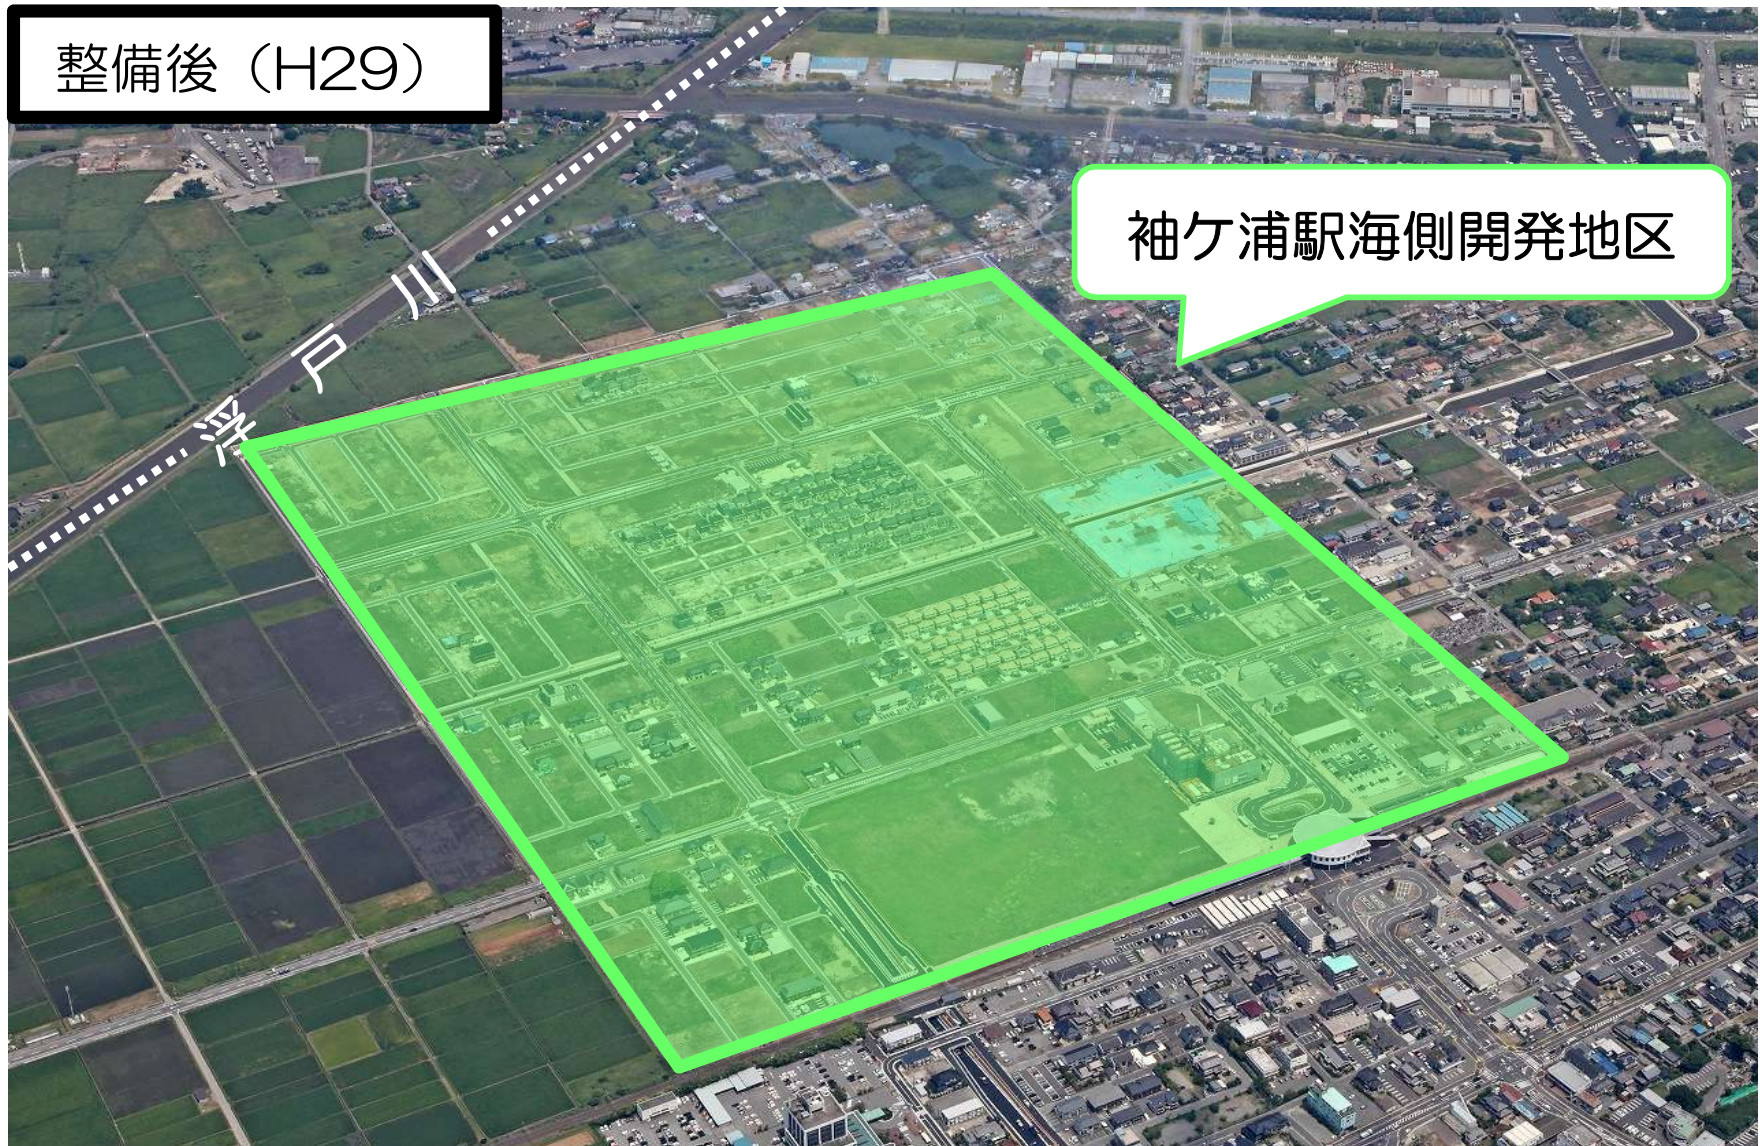

袖ヶ浦駅海側開発地区


計画概要

— 未普及解消とは① —

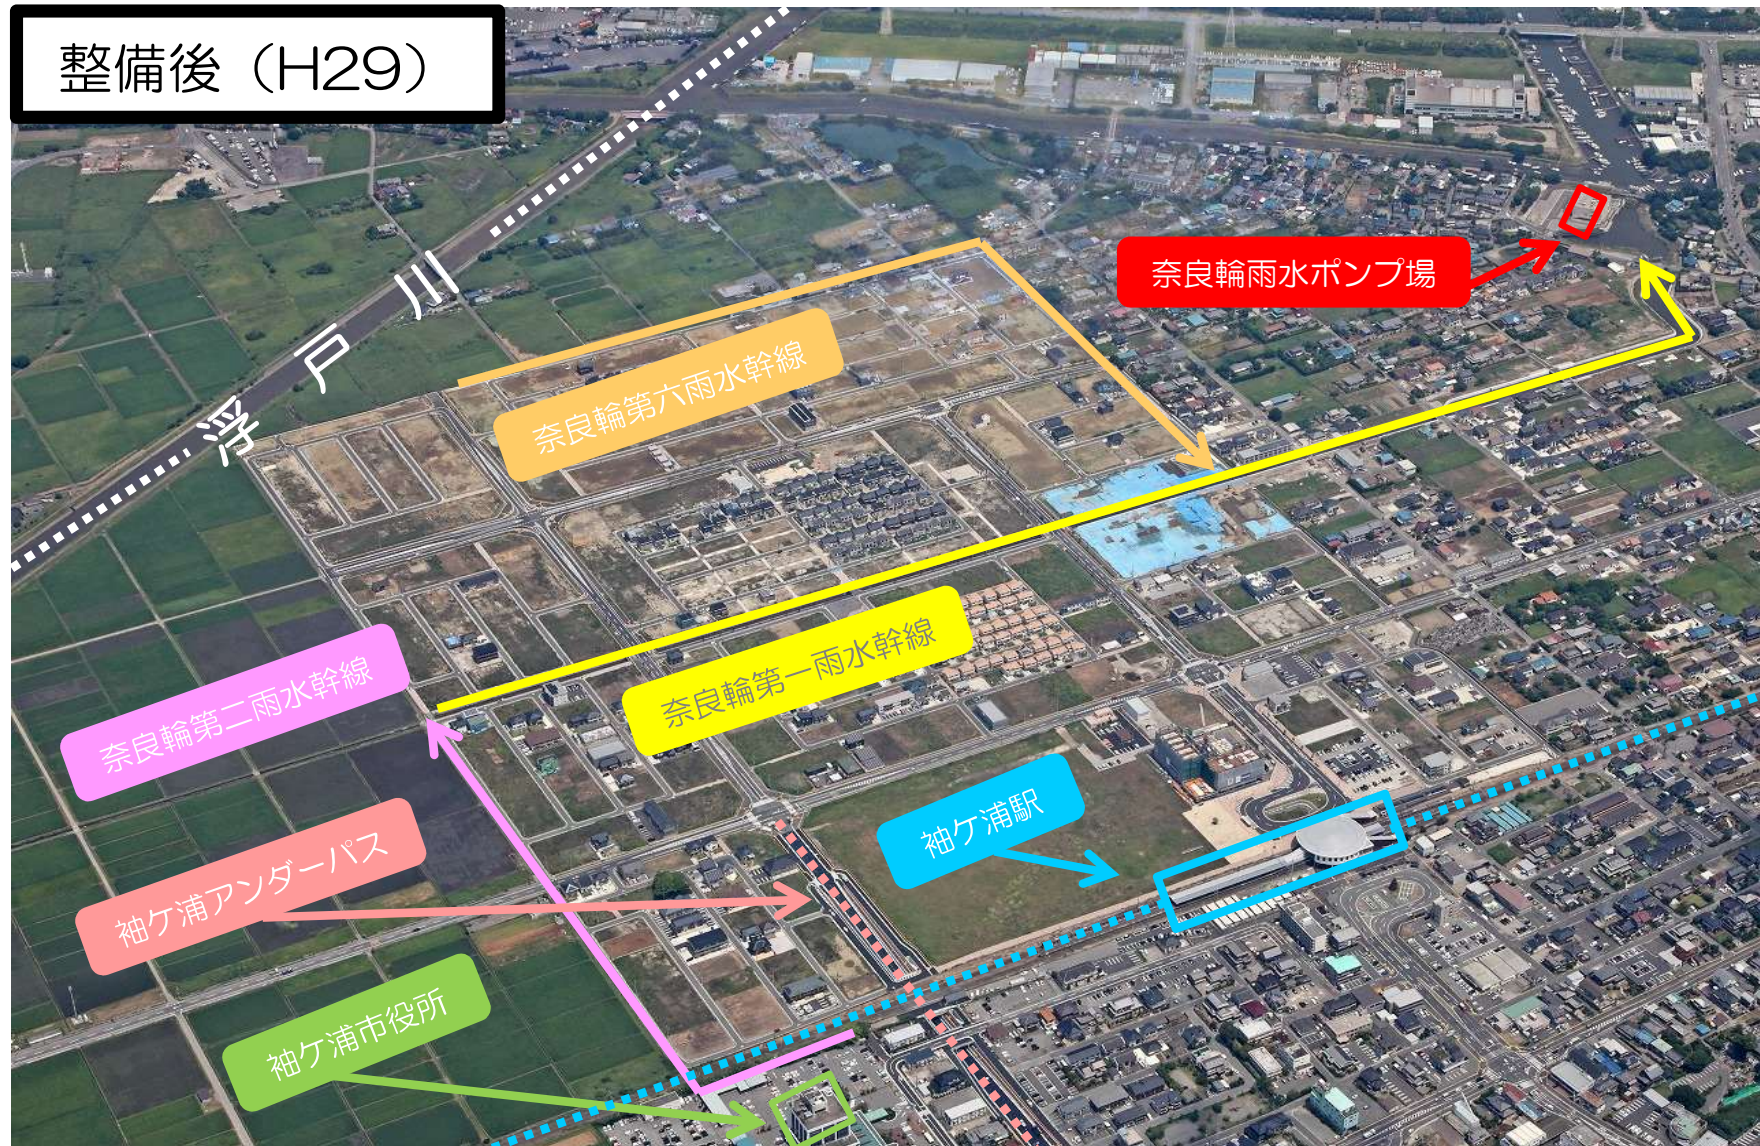

計画概要

— 未普及解消とは① —

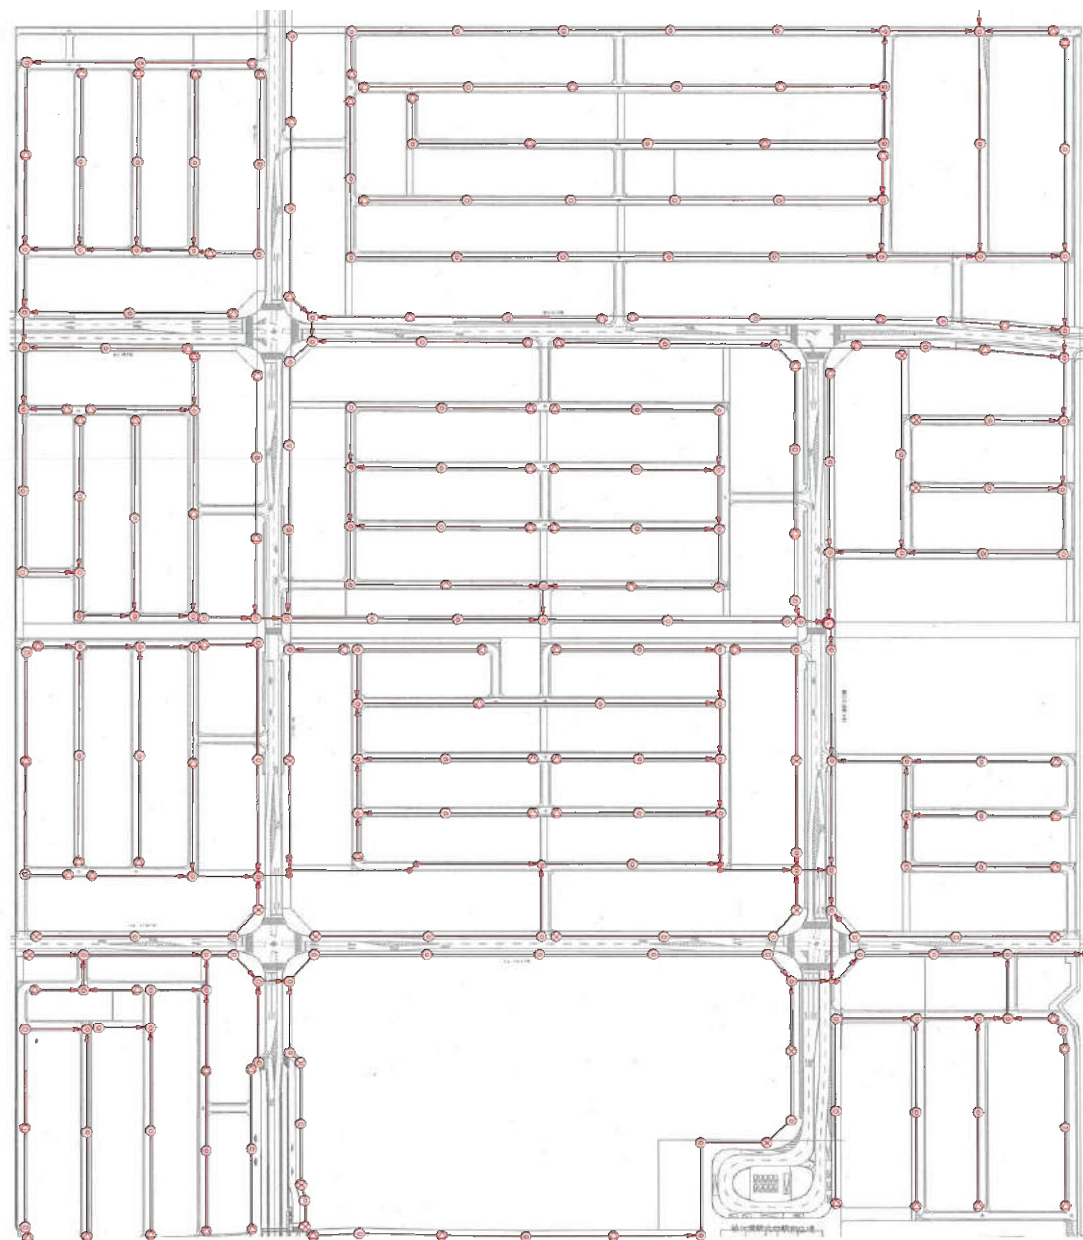

道路図のみ

雨水管

污水管

計画概要

— 未普及解消とは② —

椎の森工業団地Ⅱ期地区

椎の森工業団地Ⅱ期地区は令和元年7月で第4回目の入札を終え、全13区画が落札され引き渡し完了した区画については、すでに操業が開始されているところもあります。



第1回分譲入札分 (H29.3) 第2回分譲入札分 (H30.2) 第3回分譲入札分 (H30.10)

※袖-13地区は再度令和元年7月に入札を実施

評価内容

— 要素事業（交付対象）の進捗状況と目標値の達成状況 —

《目標値（定量指標）の達成状況》

| 計画の成果目標（定量的指標） | 当初 現況値 (H28) | 最終 目標値 (H30) | H30末 実績値 | 目標値と 実績値に 差が出た要因 | 備考 |
|--|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 下水道による污水管整備（袖ヶ浦駅海側） 污水管整備完了済み延長（m）／污水管を実施すべき 延長（m） | 99% | 100% | 100% | — | 15,382m / 15,382m |
| 下水道による污水管整備（椎の森地区） 污水管整備完了済み延長（m）／污水管を実施すべき 延長（m） | 50% | 100% | 100% | — | 1,855m / 1,855m |

《交付対象事業の進捗状況》

| 事業区分 | 番号 | 要素となる事業名 | 計画の事業費（百万円） | | 事業進捗状況の概要 |
|-------|---------|--------------------|-------------|------|------------|
| | | | 計画 | 実施 | |
| A基幹事業 | A07-001 | 奈良輪第一污水幹線整備（未普及解消） | 10 | 9.2 | 平成28年度事業完了 |
| | A07-002 | 久保田第一污水幹線整備（未普及解消） | 84 | 83.6 | 平成29年度事業完了 |

事業評価と特記事項（今後の方針等）

事後評価

－ 社会資本整備総合交付金 －

整備計画名【袖ヶ浦市における生活環境の改善（Ⅱ期）】

（事業評価）

- ・ 袖ヶ浦駅海側区画整理地内の污水管が概成したことにより、地域の住宅開発が進み、良好な住環境に貢献している。
- ・ 椎の森工業団地Ⅱ期地区の污水管は整備率100%となった。
なお、進出企業の操業開始に合わせ、供用開始している。

（今後の方針）

- ・ 東京湾流域別下水道総合計画の状況を踏まえ、新たな放流水の水質基準（放流水質基準の強化）などの具体的な方向性が示されてから、処理場における増設及び高度処理化に取り組んでいく。

中間評価

－ 防災・安全交付金 －

整備計画名【袖ヶ浦市における防災・安全対策強化に貢献する下水道整備（Ⅱ期）（防災・安全）】


（事業評価）

- ・ 袖ヶ浦終末処理場の長寿命化計画を実施したことで、施設の適切な維持管理を進めることができた。
- ・ 椎の森工業団地Ⅱ期地区の雨水管は整備率100%となった。
なお、進出企業の操業開始に合わせ、供用開始している。
- ・ 奈良輪雨水幹線事業は概ね完了した。
残り約80mの整備については都市計画道路整備と同時に施工予定。

（今後の方針）

- ・ 東京湾流域別下水道総合計画の状況を踏まえ、新たな放流水の水質基準（放流水質基準の強化）などの具体的な方向性が示されてから、処理場における長寿命化及び高度処理化に取り組んでいく。
- ・ 総合地震対策については、中間目標値を既に達成しており、今後も更に整備を推進する。

ありがとうございました。



袖ヶ浦市
