


社会資本総合整備計画 事後評価

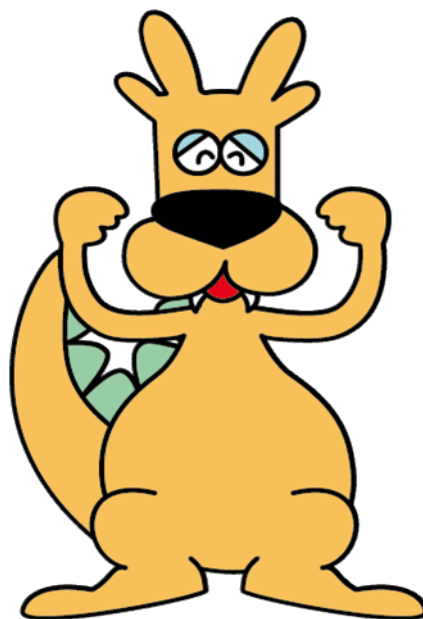

袖ヶ浦市

社会資本総合整備計画とは

社会資本整備総合交付金の概要

概要

◇社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって…

自由度が高く、創意工夫を活かせる総合的な交付金として平成22年度に創設。

特徴（従前の補助金との違い）

◇これまで事業別にバラバラで行ってきた関係事務を一本化・統一化


◇計画に位置付けられた事業の範囲内で、地方公共団体が国費を自由に充当可能

◇基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高める事業についても、創意工夫を生かして実施可能

<従前の補助金>



個別補助金を原則禁止



社会資本整備総合交付金

【社会資本整備総合交付金】

- ・成長力強化や地域活性化等につながる事業

【防災・安全交付金】

- ・「命と暮らしを守るインフラ再構築」、
「生活空間の安全確保」を集中的に支援


住宅・社会資本の整備



効果促進事業

整備計画に掲げる政策目標の達成（成果指標で**評価を実施**）

袖ヶ浦市の下水道事業における社会資本総合整備計画の概要について

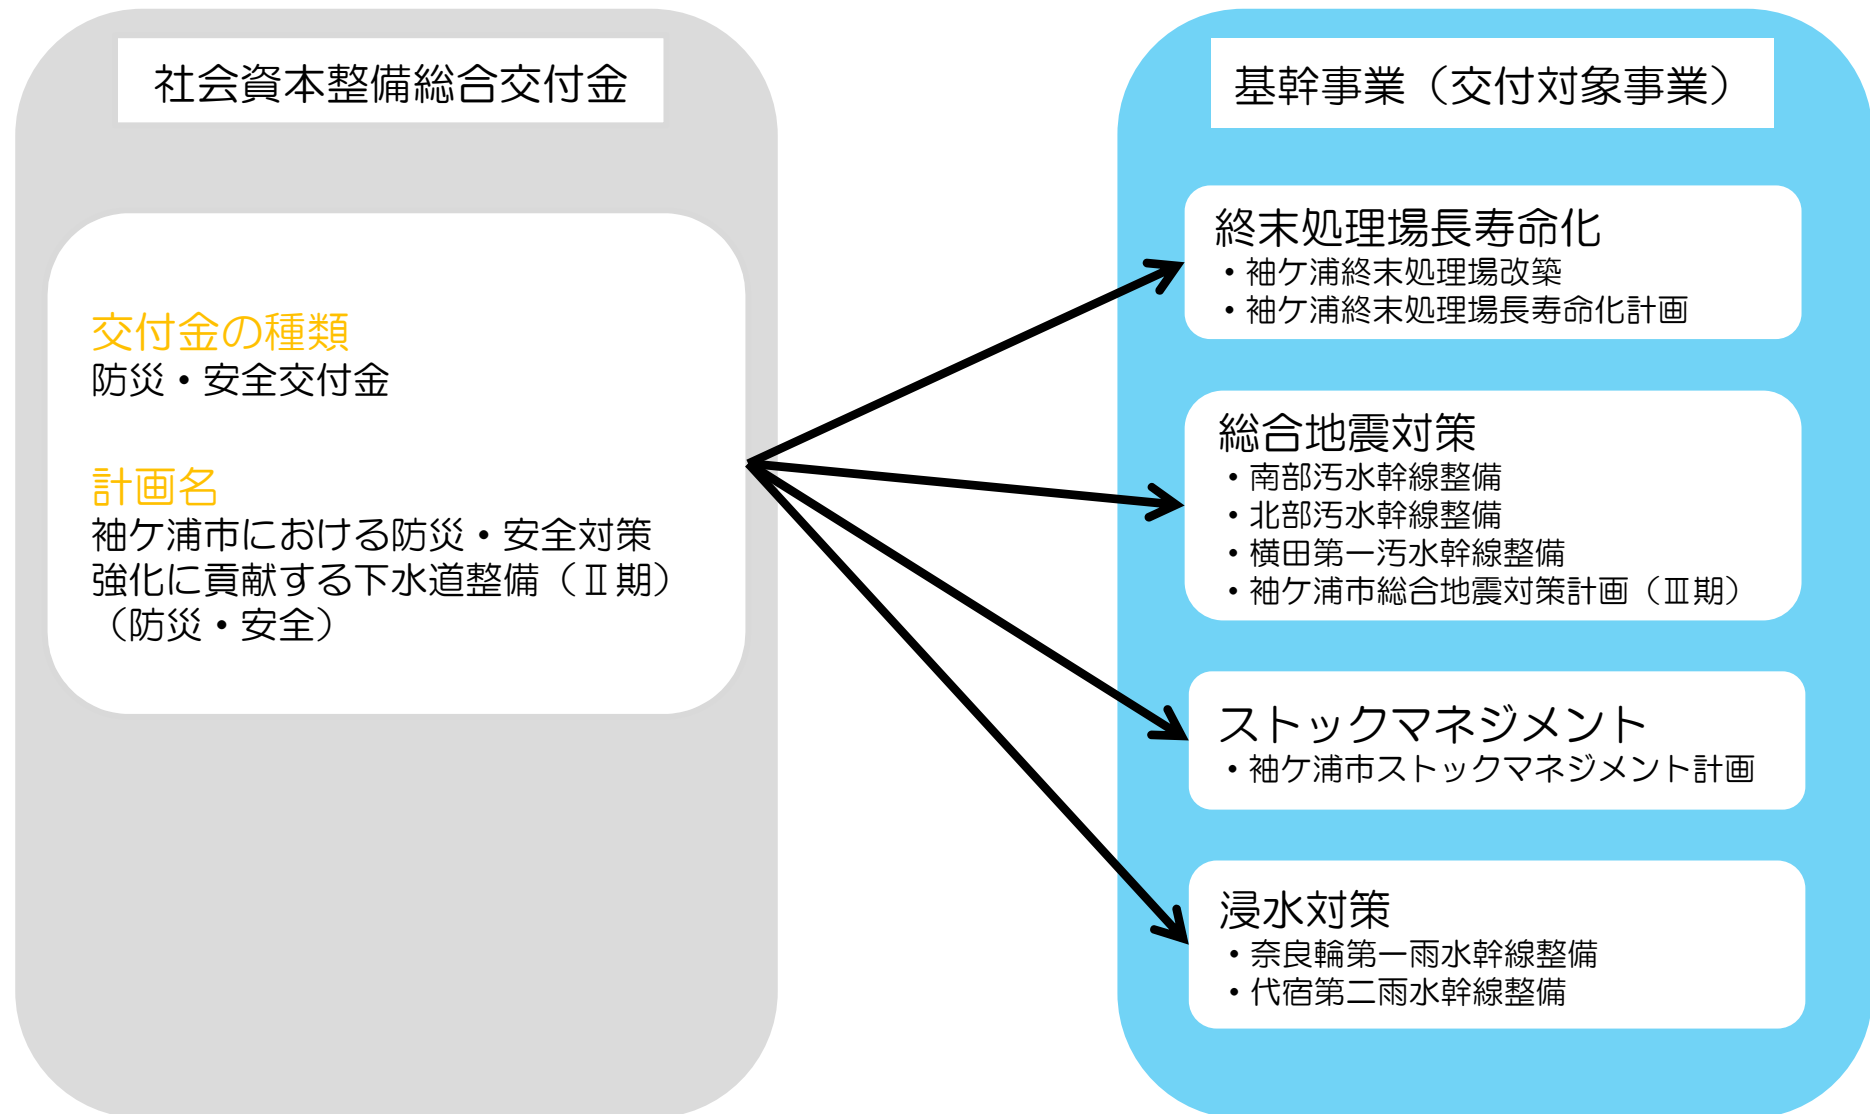

事後評価

－ 防災・安全交付金 －

計画概要

社会資本総合整備計画 事後評価調書

◆計画の名称

袖ヶ浦市における防災・安全対策強化に貢献する下水道整備（Ⅱ期）（防災・安全）

◆計画期間

平成28年度～平成32年度（令和2年度）【5年間】

◆計画の目標

雨水排水施設を整備することにより、雨水を排除し、浸水を防除する。

◆主な事業

処理場改築更新、地震対策整備、奈良輪地区雨水管整備、椎の森地区雨水管整備

事業位置図

No.1袖ヶ浦処理区(事業計画区域)

No.2奈良輪第一排水区

No.3椎の森工業団地排水区

【浸水対策】
A07-003 奈良輪第一雨水幹線整備

【長寿命化】
A07-002 袖ヶ浦終末処理場改築(長寿命化計画(Ⅰ期))

【地震対策】
A07-001 北部污水幹線他整備

【地震対策】
A07-001 北部污水幹線他整備
(マンホールトイレ設置)

【地震対策】
A07-005 南部污水幹線他整備

【地震対策】
A07-001 北部污水幹線他整備
(マンホールトイレ設置)

【地震対策】
A07-005 南部污水幹線他整備
(マンホールトイレ設置)

【浸水対策】
A07-004 代宿第二雨水幹線他整備
(袖ヶ浦椎の森工業団地整備事業)

【地震対策】
A07-005 南部污水幹線他整備
(マンホールトイレ設置)

【地震対策】
A07-006 袖ヶ浦市下水道総合地震対策計画(Ⅲ期)

【地震対策】
C07-001 横田第一污水幹線他整備(災害時応急復旧資機材整備)

【地震対策】
A07-007 横田第一污水幹線整備

【ストックマネジメント事業】
A07-008 下水道ストックマネジメント計画

袖ヶ浦駅海側
土地区画整理事業

- | | |
|--|--|
|  下水道法による事業計画区域 |  雨水対策整備事業 |
|  既設幹線 |  総合地震対策整備事業 |
|  P1 奈良輪ポンプ場 |  長寿命化及びストックマネジメント事業 |
|  P2 横田汚水中継ポンプ場 |  新設雨水幹線 |
|  T 袖ヶ浦終末処理場 |  総合地震計画管渠整備路線 |
|  袖ヶ浦駅海側土地区画整理区域 |  マンホールトイレ |

計画概要

— 終末処理場長寿命化とは —

老朽化した処理施設等を、機能停止などの事故を未然に防ぎ、維持管理コストの縮減と下水道事業費の平準化をはかるために策定した計画。

- ・水中攪拌機…工場にて部品交換（電動機、軸シール）を実施し、設備の延命化をした。
- ・No.2汚水ポンプ…工場にて部品交換（軸受、軸シール、塗装）を実施し、設備の延命化をした。

水中攪拌機

汚水に微生物の入った活性汚泥を混ぜ、空気を吹き込んで汚れを沈みやすくする
反応タンクの中を混ぜる機械

施工前



施工中




施工後



No.2汚水ポンプ

沈砂池で最初に汚水の中の大きなゴミや土砂を取り除いた後に次の沈澱池に汚水を揚水するポンプ

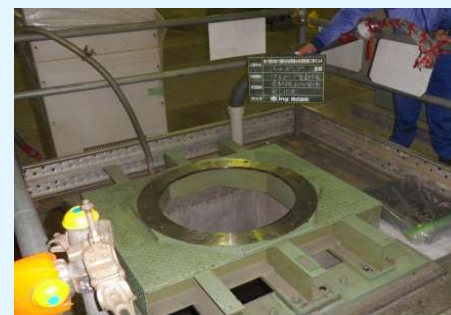

計画概要

袖ヶ浦市内の下水道管の総延長
約240km

主要施設及び路線等

- 主要道路（県緊急輸送路）
- 鉄道
- 主要施設（避難場所）
- 医療機関
- 介護施設

上記（主要施設及び路線等）に関連する幹線を対象に
総合地震対策計画を策定し、事業実施


重要な幹線等

- 重要な幹線
- 耐震済み路線
- 耐震不足路線

マンホールトイレ

- 避難場所マンホールトイレ設置済箇所

— 総合地震対策とは① —

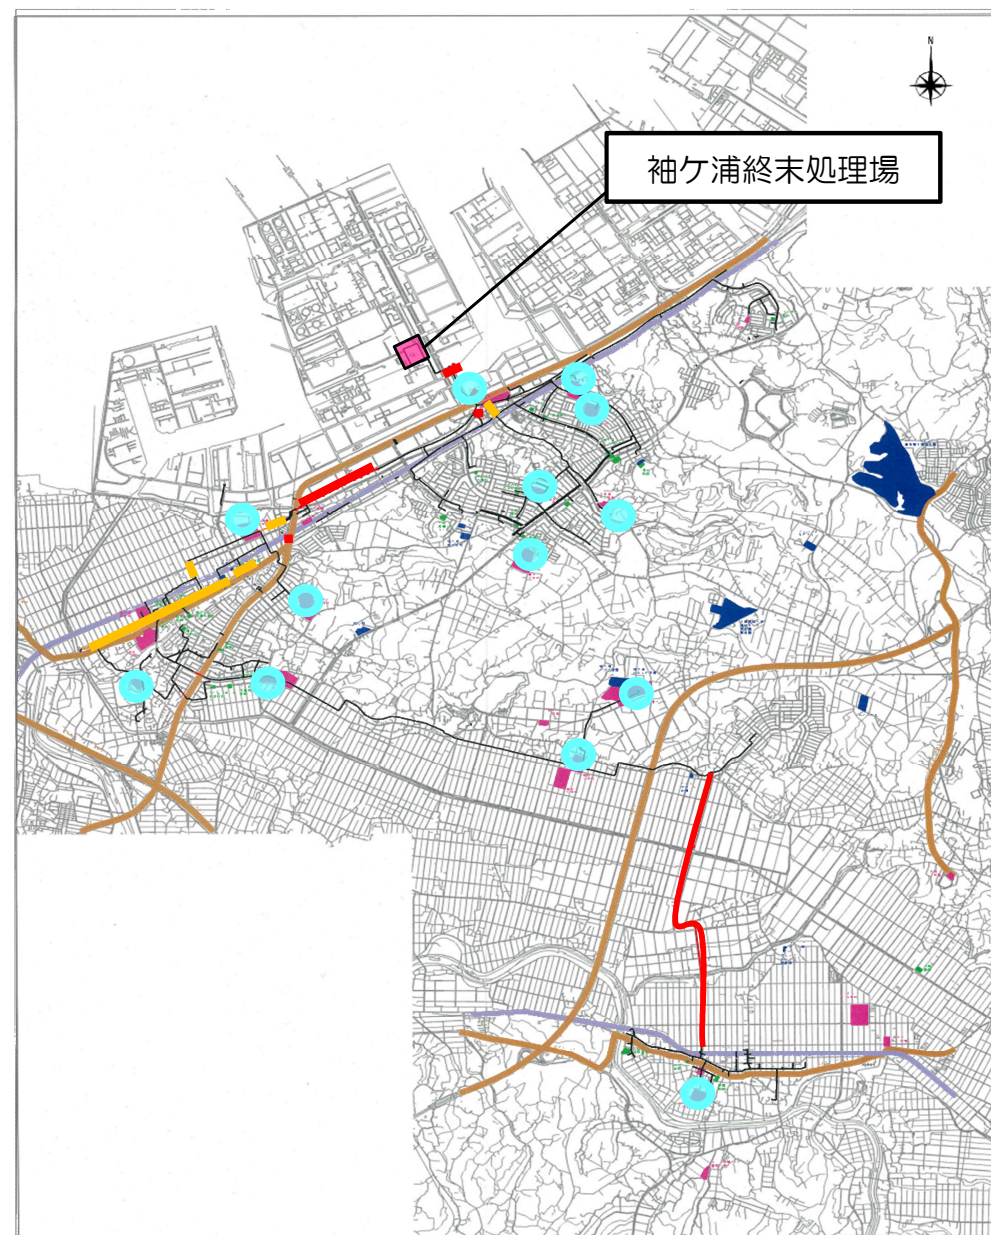

計画概要

— 総合地震対策とは② —

マンホールトイレ整備

災害時、防災拠点・避難所等において大量の汚水が予想される環境下の衛生確保として、災害用トイレの整備が重要です。
公共下水道が供用している指定避難所にマンホールトイレを設置することにより、災害時の快適なトイレ機能を確認することができます。



※令和2年度に新しく設置された、臨海スポーツセンターのマンホールトイレです。

計画概要

— 浸水対策とは① —

奈良輪第一雨水幹線整備

設計にあたり、ポンプ場に流入する雨水幹線を**拡幅**して、雨水貯留量を多くし、その分ポンプ整備の能力を小さくしたことや、遠方監視システムを採用した事によって経済性にも配慮した設計となっております。また、奈良輪ポンプ場の稼働後、対象地区において道路冠水等の発生は見られていません。

施工前後の違い

約 **4** 倍



※同じ場所からの撮影です。

計画概要

椎の森工業団地Ⅱ期地区

椎の森工業団地Ⅱ期地区は令和元年7月で第4回目の入札を終え、全13区画の売却が完了し、すでに操業が開始されています。



— 浸水対策とは② —



第1回分譲入札分 (H29.3) 第2回分譲入札分 (H30.2) 第3回分譲入札分 (H30.10)

評価内容

— 目標値（定量指標）の達成状況 —

計画の成果目標（定量的指標）	当初 現況値 (H28)	最終 目標値 (R2)	R2 実績値	目標値と実績値に 差が出た要因	備考
処理場における長寿命化計画（I期）達成率 主要施設の改築更新実施済施設数（施設）／主要施設の改築更新実施予定施設（施設）	60%	100%	100%	—	132施設／ 132施設
重要な管渠の地震対策実施率 重要な管渠のうち、耐震化または、減災対策が行われている延長（km）／重要な管渠の延長（km）	48%	57%	96%	人孔浮上防止対策工事など、前倒しで実施したことによる実績値の増。	62.23km／ 64.74km
下水道による雨水管整備率（椎の森工業団地排水区） 雨水管整備完了済み延長（m）／雨水管を実施すべき延長（m）	48%	100%	100%	—	1,956m／ 1,956m
下水道による雨水幹線整備率（袖ヶ浦駅前地区） 整備済延長（m）／整備すべき延長（m）	80%	92%	93%	残り約80mの整備については、都市計画道路整備と同時に施工予定。	1,128m／ 1,208m

評価内容

— 交付対象事業の進捗状況 —

事業区分	番号	要素となる事業名	計画の事業費 (百万円)		事業進捗状況の概要
			計画	実施	
A基幹事業	A07-002	袖ヶ浦終末処理場改築（長寿命化計画（Ⅰ期））	470	469.4	平成29年度事業完了
	A07-003	奈良輪第一雨水幹線整備（浸水対策）	396	395.8	
	A07-004	代宿第二雨水幹線整備（浸水対策）	339	338.1	
	A07-006	総合地震対策計画（Ⅲ期）（地震対策）	5	4.9	
	A07-001	北部污水幹線他整備（地震対策）	85	90	マンホール整備（長浦中・蔵波中・長浦公民館・臨スポ） 人孔浮上対策（14/33箇所）
	A07-005	南部污水幹線他整備（地震対策）	91	33	マンホール整備（市民会館・ガウランド・袖ヶ浦高校） 人孔浮上対策（14/22箇所）
	A07-007	横田第一污水幹線整備（地震対策）	137	96	1,657m/3,280m 進捗率51%
	A07-008	袖ヶ浦市ストックマネジメント計画	10	15	内面調査（国道・JR軌道下） マンホール蓋交換

事業評価と特記事項（今後の方針等）

事後評価

— 防災・安全交付金 —

整備計画名【袖ヶ浦市における防災・安全対策強化に貢献する下水道整備（Ⅱ期）（防災・安全）】

（事業評価）

- ・袖ヶ浦終末処理場の長寿命化計画を実施したことで、施設の適切な維持管理を進めることができた。
- ・浸水対策事業として実施した椎の森工業団地Ⅱ期地区の雨水管は整備率100%となり、既に多くの企業が操業開始しており、供用開始している。奈良輪雨水幹線事業は概ね完了し、残り約80mの整備については、都市計画道路整備と同時施工予定している。
- ・地震対策事業では、第Ⅲ期総合地震対策計画での避難所マンホールトイレ整備13箇所の設置を完了し、人孔浮上対策と横田第一汚水幹線の圧送管二条化を進めており、耐震不足の耐震計画延長の~~43.4~~9%を実施し、全体の耐震化率は~~94.3~~94.8%となった。

（今後の方針）

- ・東京湾流域別下水道総合計画の状況を踏まえ、新たな放流水の水質基準（放流水質基準の強化）などの具体的な方向性に注視しながら、処理場における長寿命化及び処理槽増設、高度処理化に取り組んでいく。
- ・総合地震対策については、Ⅳ期計画策定に向け国の動向を注視し、今後も更に整備を推進する。

次期計画

— 防災・安全交付金 —

整備計画名【袖ヶ浦市における防災・安全対策強化に貢献する下水道整備（Ⅲ期）（防災・安全）】


（計画の期間）

令和3年度～令和7年度（5年間）

（事業の概要）

- ・総合地震対策計画においては、展開している事業を継続的に実施するとともに、総合地震対策計画Ⅳ期計画の策定、終末処理場耐震診断の実施を行う。
- ・ストックマネジメント計画においては、引き続き老朽化したマンホール蓋交換を実施するとともに、処理場増改築の検討とストックマネジメント計画Ⅱ期の策定を行う。

ありがとうございました。

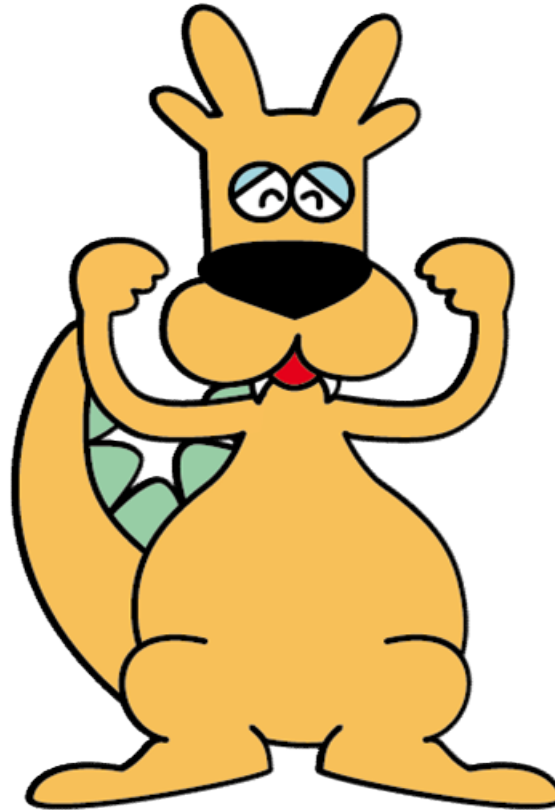

袖ヶ浦市
